

8/2


### 週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)
		R1.7			R1.8				R1.8								
月		29	30	31	1	2	3	④	5	6	7	8	9	10	①		
日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
(車線規制) 曜日																	
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-7)		(予備日)	(PS-31-33)											ひび割れ補修	24.00~6.00
		南行き走行															
1車線規制	梅田長柄線跨道橋		(10-1)	(予備日)	(PS-41-43)											ひび割れ補修	24.00~6.00
		南行き走行															
1車線規制	梅田長柄線跨道橋				(10-4) PS-41-43 (予備日)											ひび割れ補修	24.00~6.00
				北行き走行													
1車線規制	茶屋町高架橋				(7-1) (PS-28-35)							(予備日)				引張・密着試験 表面被覆	24.00~6.00
				北行き走行													
1車線規制	茶屋町高架橋										(7-7)	(PSR-31-36)				表面被覆工	24.00~6.00
										南行き走行							
		(反射塗装工)			(表面被覆工)												
		1日目	下地処理+プライマー		1日目	下地処理+プライマー											
		2日目	下塗り+墨出し		2日目	パテ											
		3日目	黄色1回目+黄色2回目		3日目	中塗り											
		4日目	黄色3回目+黒色		4日目	上塗り											
		5日目	予備日		5日目	予備日											
摘要		ひび割れ注入	シリンダー撤去	予備日	ひび割れ注入	シリンダー撤去 引張試験 密着試験	1日目	休工	2日目	3日目	4日目	(予備日) 5日目	1 予備日	2 日目	休工		

北 区

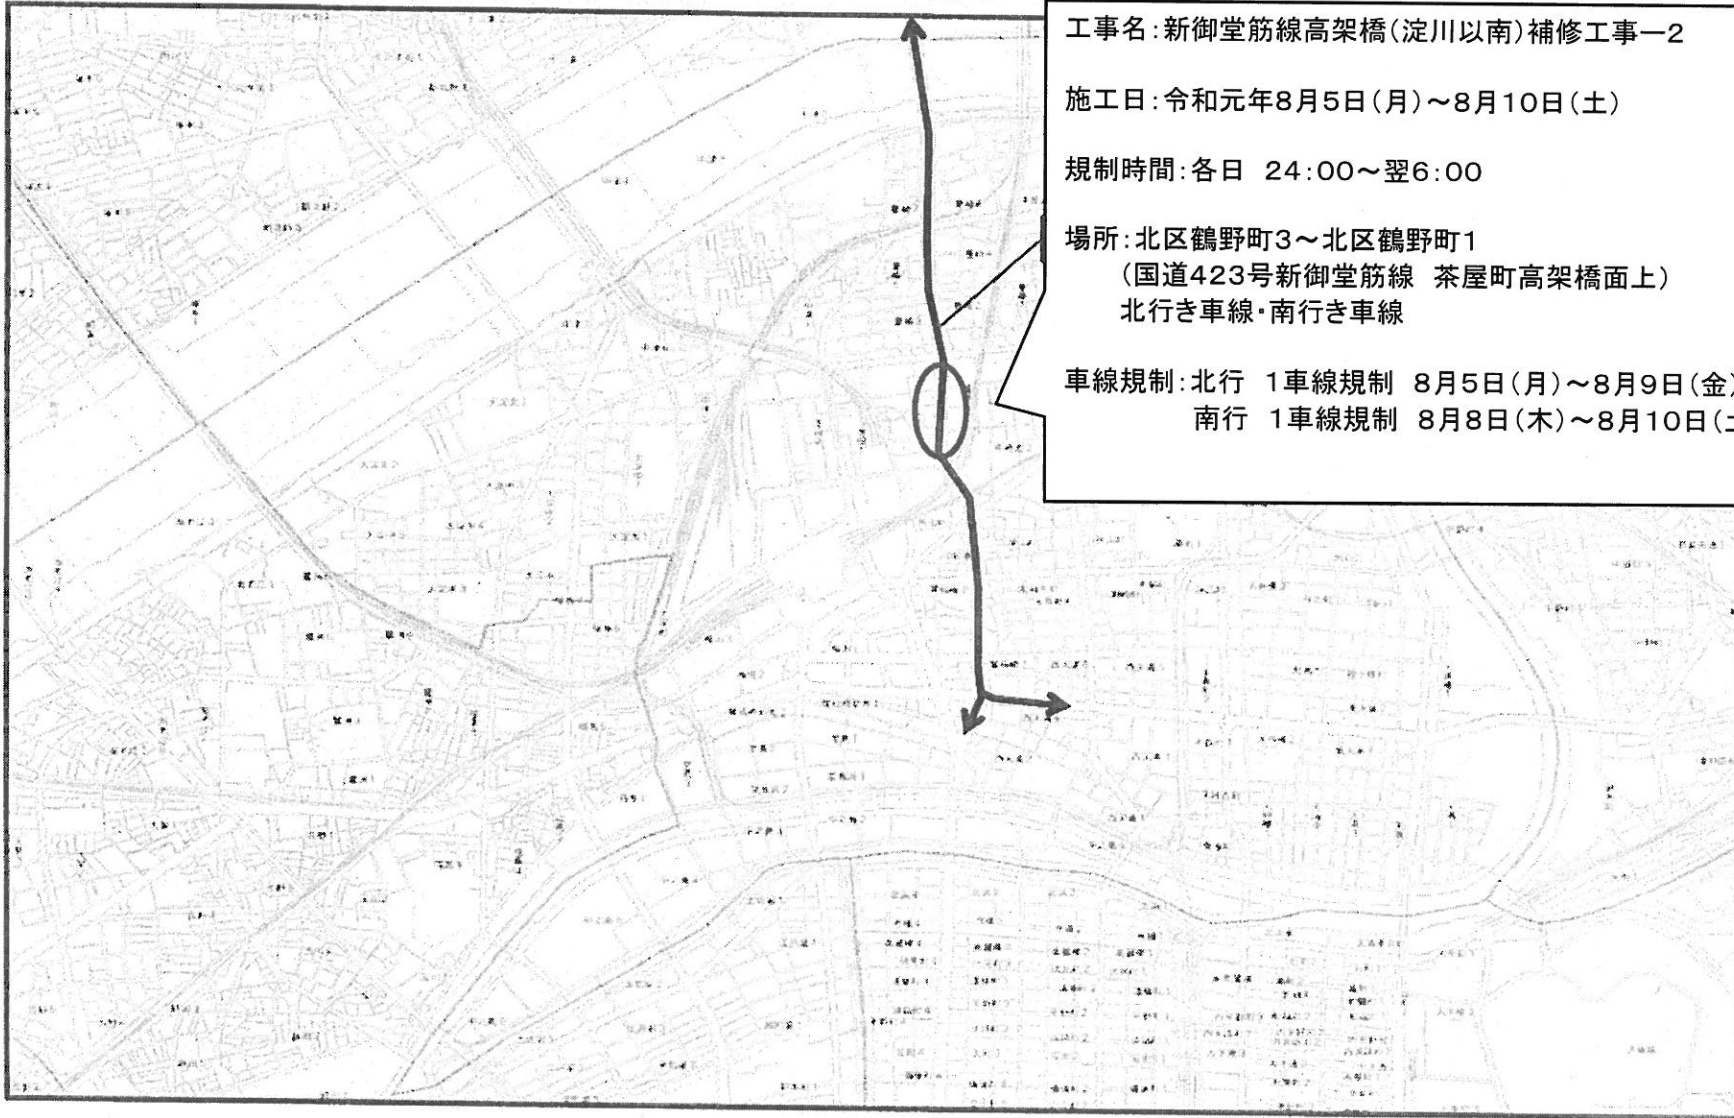

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年8月5日(月)~8月10日(土)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1  
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)  
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 8月5日(月)~8月9日(金)  
南行 1車線規制 8月8日(木)~8月10日(土)
