

8/15


週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)	
日		R1.8							R1.8									
(車線規制) 曜日		12	13	14	15	16	17	(18)	19	20	21	22	23	(24)	25			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-7)	PSR31-36		(予備日)												表面被覆工	24.00~ 6.00
		南行き走行		(南行き走行)														
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-1)	PS-28-35		(予備日)				(7-2)								表面被覆工	24.00~ 6.00
		北行き走行		(北行き走行)				北行き追越										
1車線規制	茶屋町高架橋								(7-3)								表面被覆工	24.00~ 6.00
									南行き追越									
	(追越車線部)																	
	(走行車線部)																	
(反射塗装工)		(反射塗装工)		(表面被覆工)														
1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー		1日目 下地処理+プライマー													
2日目	下塗り+墨出し	2日目	下塗り+墨出し		2日目 パテ													
3日目	墨出し	3日目	墨出し		3日目 中塗り													
4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	黄色1回目+黄色2回目		4日目 上塗り													
5日目	黄色3回目	5日目	黄色3回目		5日目 予備日													
6日目	黒色	6日目	黒色															
摘要		2日目	3日目	4日目	5日目	予備日	予備日	休工	表面被覆工 反射塗装工 1日目	表面被覆工 反射塗装工 2日目	反射塗装工 3日目	反射塗装工 4日目	反射塗装工 5日目	休工	反射塗装工 6日目	8/19~ 北行き 南行き 同時施工		

北 区

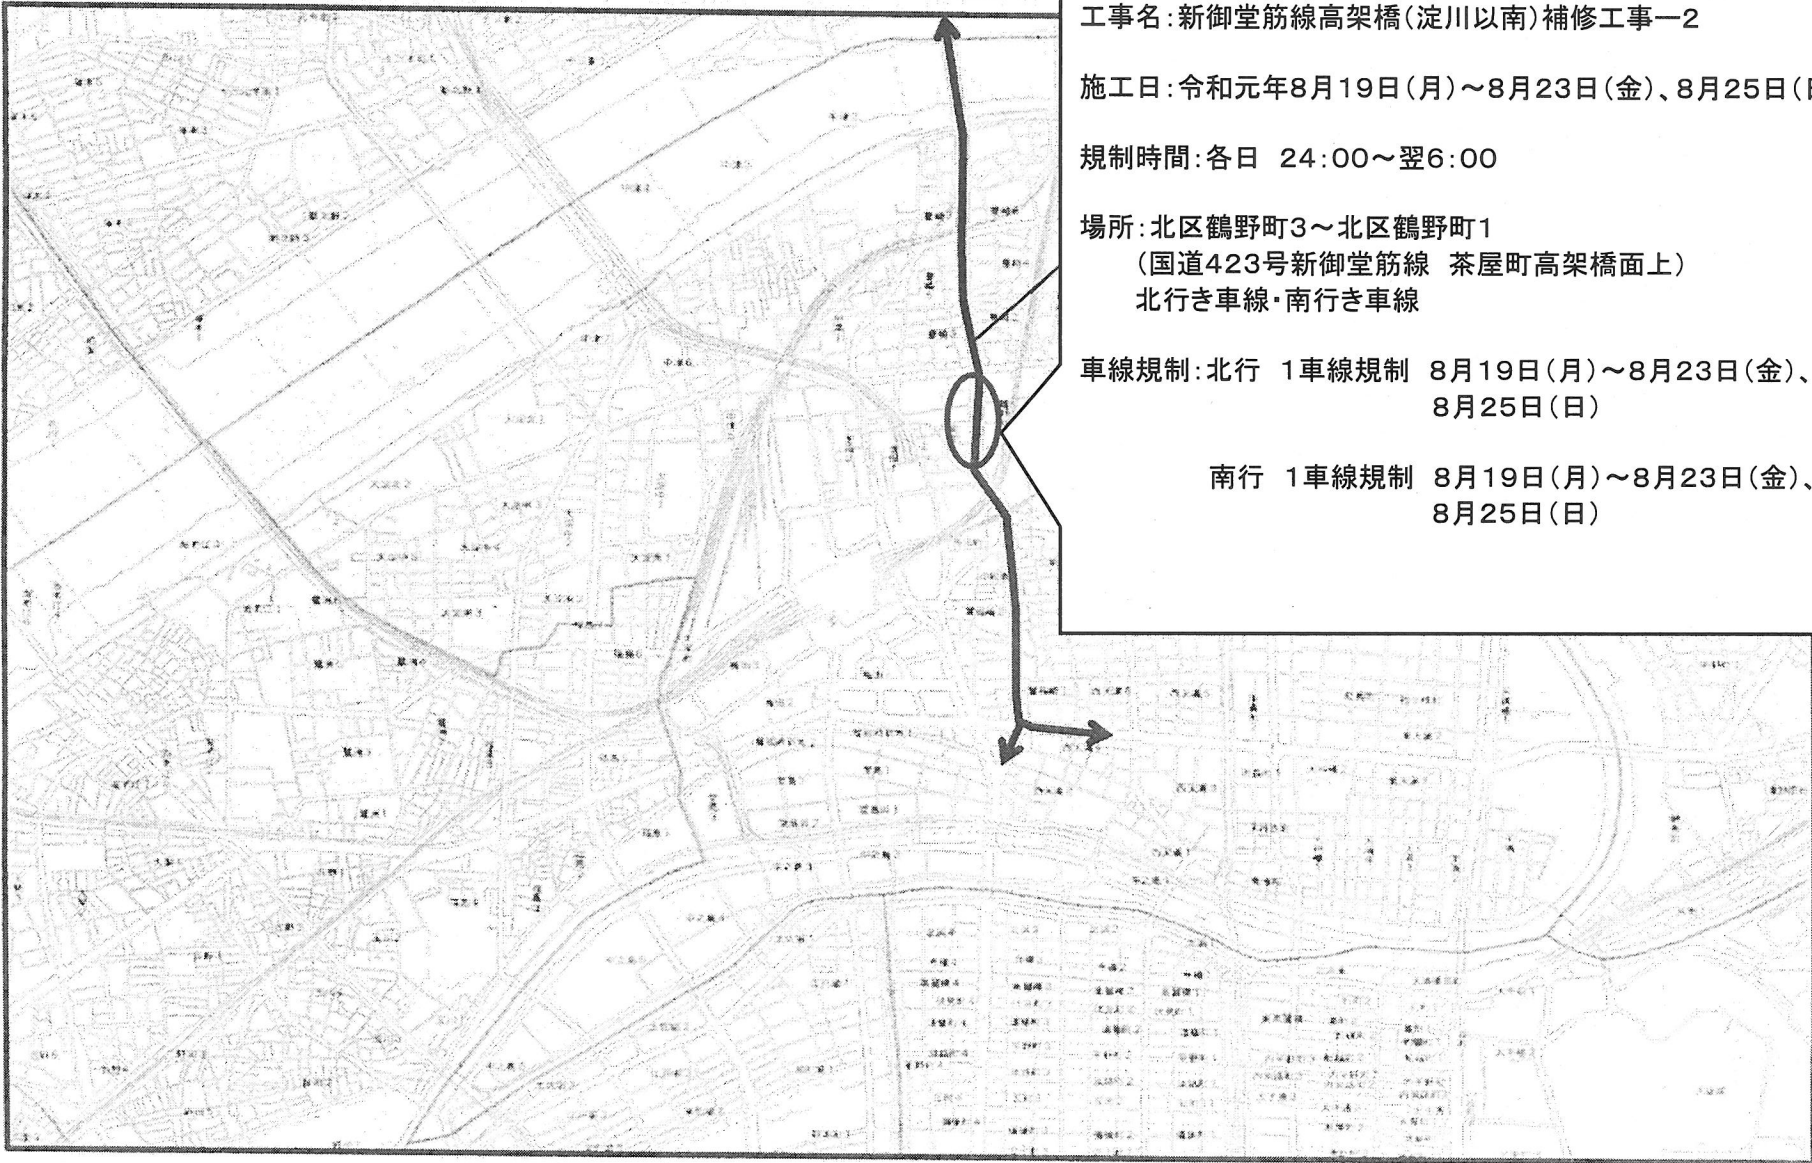

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事一2

施工日:令和元年8月19日(月)~8月23日(金)、8月25日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 8月19日(月)~8月23日(金)、
8月25日(日)

南行 1車線規制 8月19日(月)~8月23日(金)、
8月25日(日)
