

8/22


週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2
 【受注者】 株式会社 T-max
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程							翌週工程							備考	(作業時間)
月		R1.8			R1.9				R1.9								
日		26	27	28	29	30	31	①	2	3	4	5	6	7	⑧		
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-2)							(予備日)							表面被覆工	24.00~ 6.00
		北行き追越															
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-3)							(予備日)							表面被覆工	24.00~ 6.00
		南行き追越															
1車線規制	梅田長柄線跨道橋								(10-4)							表面被覆工	24.00~ 6.00
									北行き走行								
1車線規制	梅田長柄線跨道橋								(10-1)							表面被覆工	24.00~ 6.00
									南行き走行								
(追越車線部)		(走行車線部)															
(反射塗装工)		(反射塗装工)			(表面被覆工)												
1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー	1日目	下地処理+プライマー												
2日目	下塗り+墨出し	2日目	下塗り+墨出し	2日目	パテ												
3日目	墨出し	3日目	墨出し	3日目	中塗り												
4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	黄色1回目+黄色2回目	4日目	上塗り												
5日目	黄色3回目	5日目	黄色3回目	5日目	予備日												
6日目	黒色	6日目	黒色														
摘要		反射 塗装工 プライマー	反射 塗装工 2日目	反射 塗装工 3日目	(反射) 被覆工 4日目 プライマー	(反射) 被覆工 5日目	(反射) 被覆工 2日目	(反射) 被覆工 3日目	(予備日) 休工	表面被覆工 4日目	(予備日) 反射 塗装工 1日目	反射 塗装工 2日目	反射 塗装工 3日目	(反射) 被覆工 4日目 プライマー	(反射) 被覆工 5日目 2日目	(予備日) 休工	

北 区

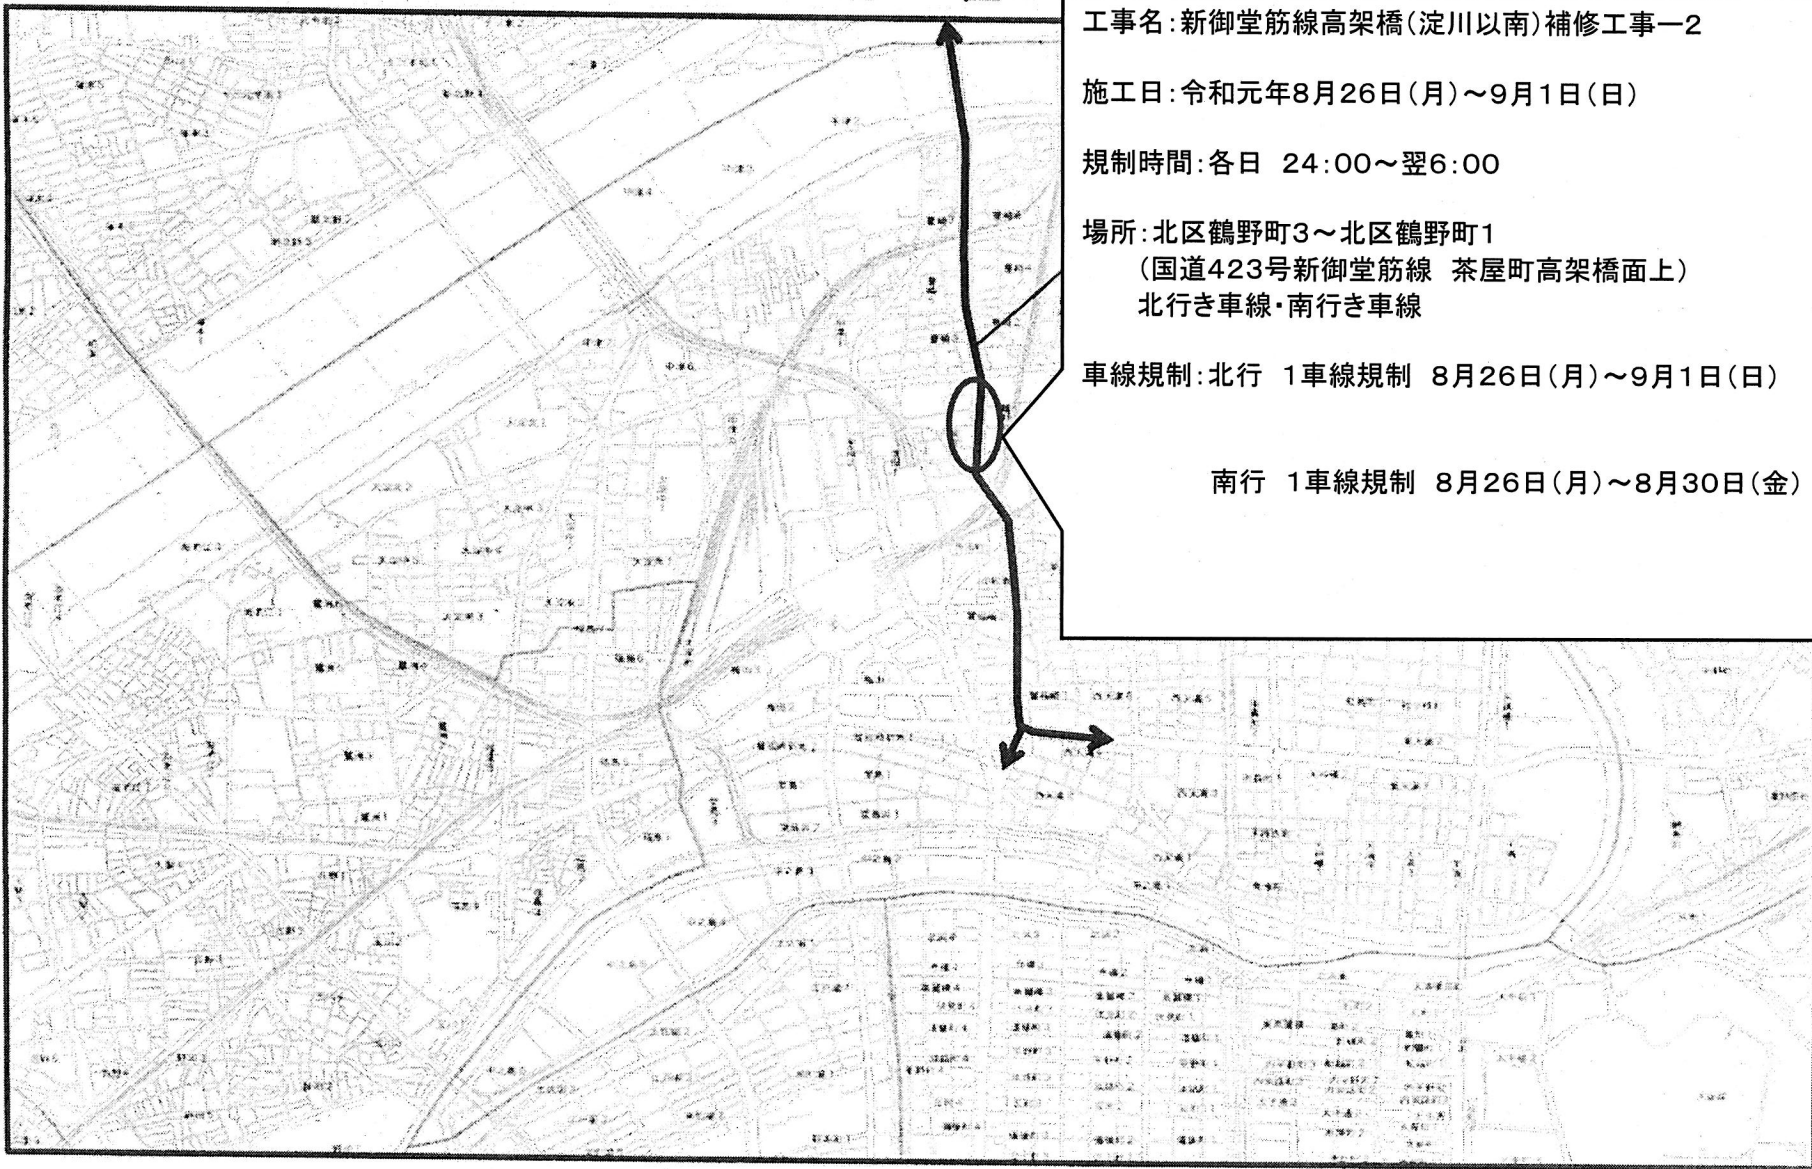

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年8月26日(月)~9月1日(日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)
北行き車線・南行き車線

車線規制:北行 1車線規制 8月26日(月)~9月1日(日)

南行 1車線規制 8月26日(月)~8月30日(金)
