


# 北 区

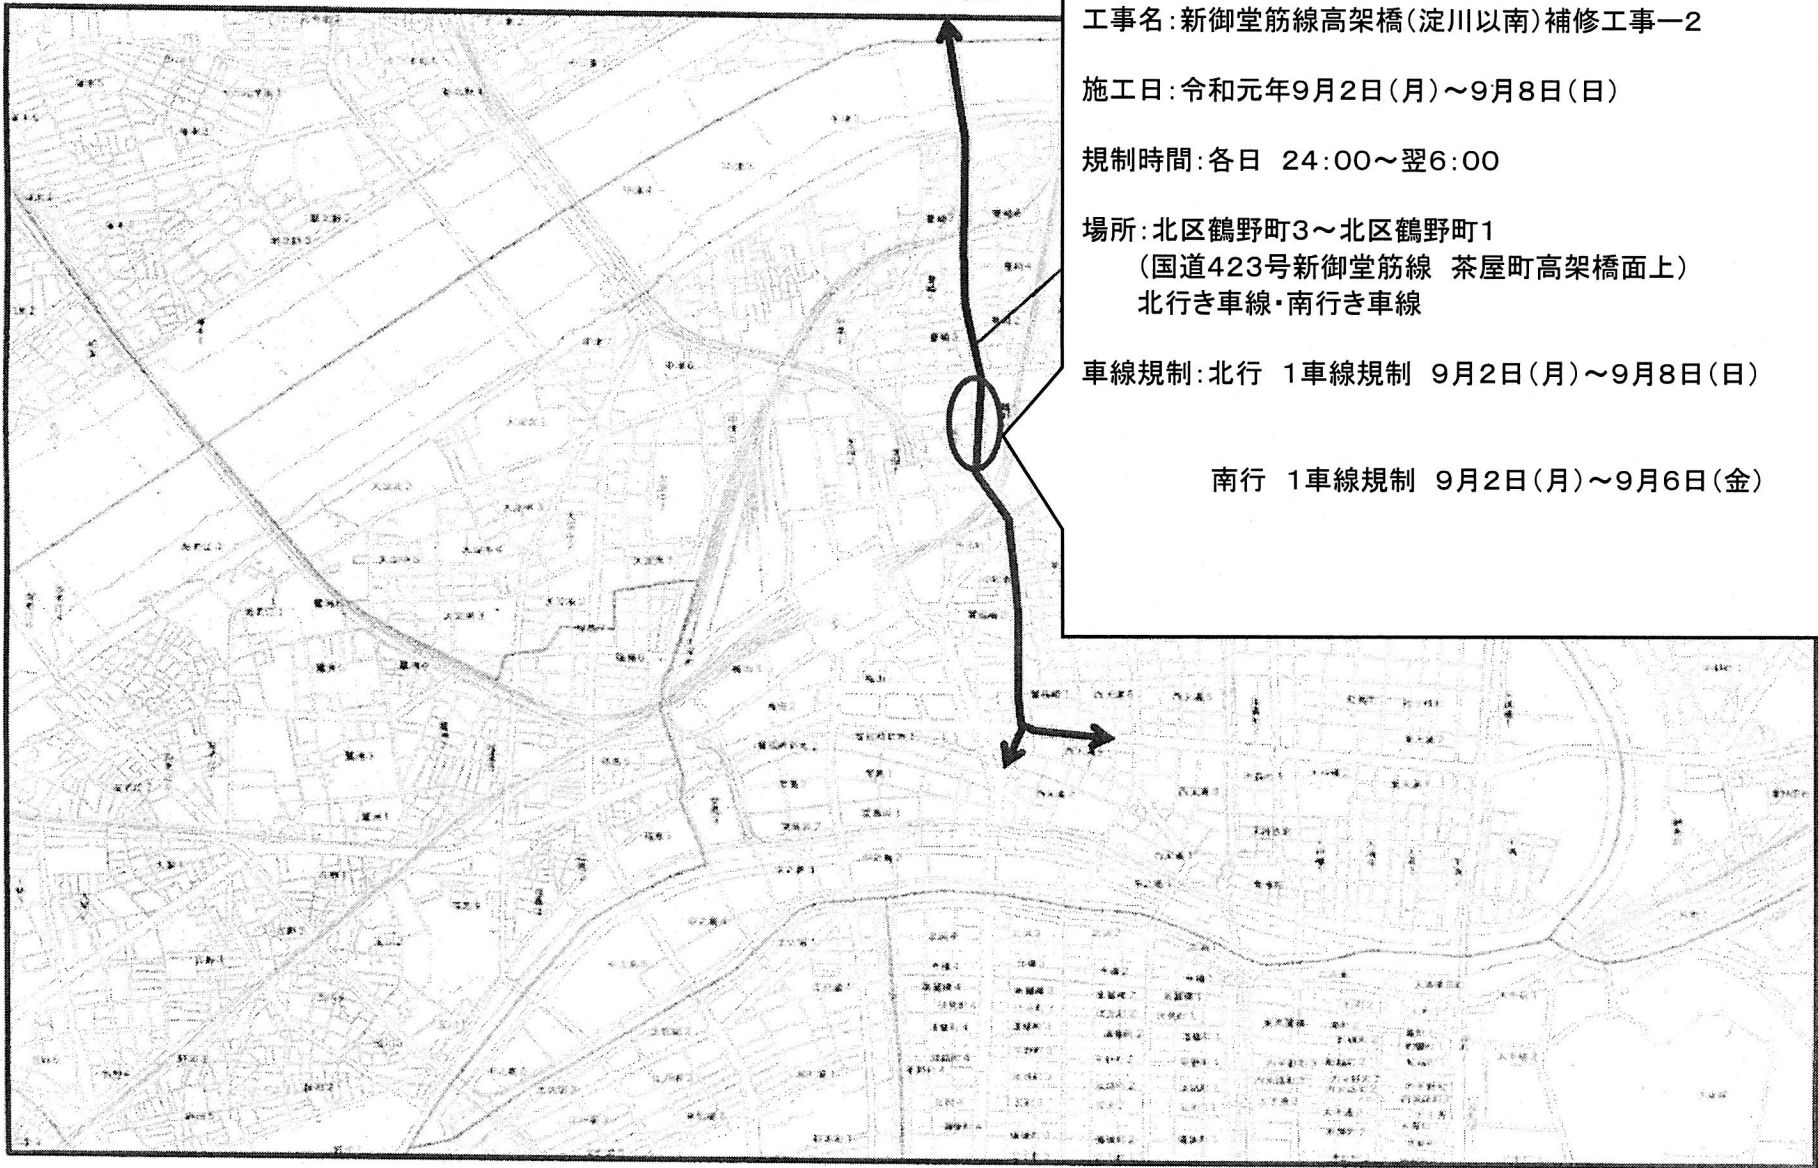

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
施工日:令和元年9月2日(月)~9月8日(日)  
規制時間:各日 24:00~翌6:00  
場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1  
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)  
北行き車線・南行き車線  
車線規制:北行 1車線規制 9月2日(月)~9月8日(日)  
南行 1車線規制 9月2日(月)~9月6日(金)

8/23

### 週間工程表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日

年月日		今週工程						翌週工程						備考	(作業時間)		
日		R1.8			R1.9			R1.9			R1.9						
(車線規制) 曜日		26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日		
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-2)						(予備日)						表面被覆工	24.00~ 6.00		
		北行き追越															
1車線規制	茶屋町高架橋	(7-3)						(舗装業者施工)						表面被覆工	24.00~ 6.00		
		南行き追越															
		8/31-9/1 9/7-8 南行き 舗装業者 施工															
(追越車線部)		(走行車線部)															
(反射塗装工)		(反射塗装工)				(表面被覆工)											
1日目 下地処理+プライマー		1日目 下地処理+プライマー				1日目 下地処理+プライマー											
2日目 下塗り+墨出し		2日目 下塗り+墨出し				2日目 パテ											
3日目 墨出し		3日目 墨出し				3日目 中塗り											
4日目 黄色1回目+黄色2回目		4日目 黄色1回目+黄色2回目				4日目 上塗り											
5日目 黄色3回目		5日目 黄色3回目				5日目 予備日											
6日目 黒色		6日目 黒色															
摘 要		プ ラ イ マ ー 工	反 射 塗 装 工 2 日 目	反 射 塗 装 工 3 日 目	(反 射) 4 日 目	(反 射) 5 日 目	(被 覆 工) (プ ラ イ マ ー)	(予 備 日) (休 工)	2 (被 覆 工) 日 目	3 (被 覆 工) 日 目	4 (被 覆 工) 日 目	5 (被 覆 工) 日 目	予 備 日	予 備 日	(予 備 日) (休 工)		
