


## 週 間 工 程 表

【工事名】 新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
 【受注者】 株式会社 T-max  
 【工営所】 北部方面管理事務所 野田工営所

【工期】 自: 平成 31 年 2 月 20 日  
 至: 令和 2 年 2 月 28 日


年月日		今 週 工 程							翌 週 工 程							備 考	(作業時間)
月		R1.7							R1.7								
日		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
(車線規制) 曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1車線規制	梅田長柄線跨道橋	(10-4)	PS-41-43)													断面修復・ひび割れ補修・表面被覆	24.00~6.00
			北行き走行														
1車線規制	豊崎南高架橋					(5-1・5-2)(予備日)										伸縮装置補修調査	24.00~6.00
						北行き走行・追越											
1車線規制	梅田長柄線跨道橋								(10-1)	PS-41-43	(予備日)					断面修復・ひび割れ補修・表面被覆	24.00~6.00
									南行き走行								
1車線規制	茶屋町高架橋										(7-1)	(PS28-33)		(予備日)		試験施工・ひび割れ補修	24.00~6.00
											北行き走行						
1車線規制	豊崎南高架橋										(プライマー・パテ)	(中塗り)	(上塗り)	(5-1・5-2)(予備日)		伸縮装置補修調査	24.00~6.00
											(セフラ密着試験)	(ケレン・エポキシ)	(下塗り)	北行き走行・追越			
摘 要		修地(付) 処理・断面修復・ひび割れ補修	休工	休工	休工	豊崎南高架橋調査工	予備日	休工	修地(付) 処理・断面修復・ひび割れ補修	断面修復・下地処理・ひび割れ補修	ひび割れ注入試験施工	シリンダー撤去	試験施工	豊崎南高架橋調査工	予備日		

北 区

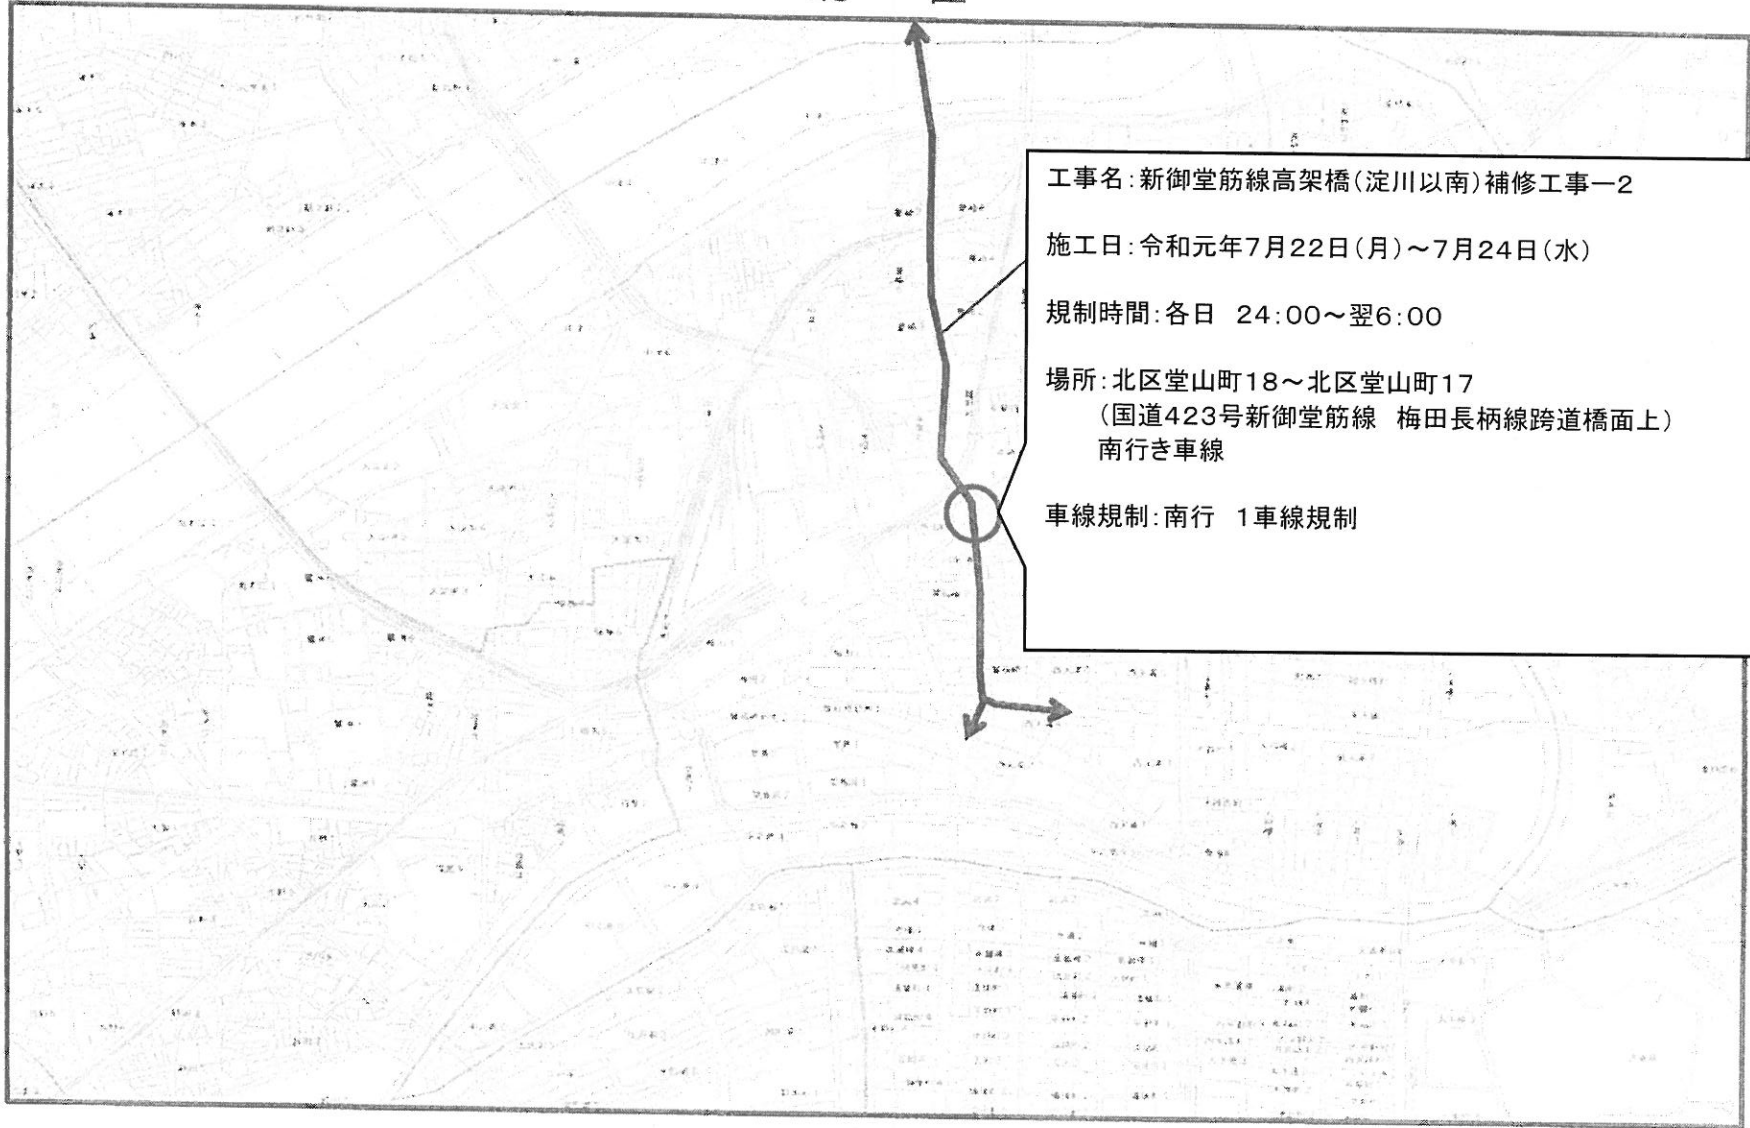

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2  
施工日:令和元年7月22日(月)~7月24日(水)  
規制時間:各日 24:00~翌6:00  
場所:北区堂山町18~北区堂山町17  
(国道423号新御堂筋線 梅田長柄線跨道橋面上)  
南行き車線  
車線規制:南行 1車線規制

北 区

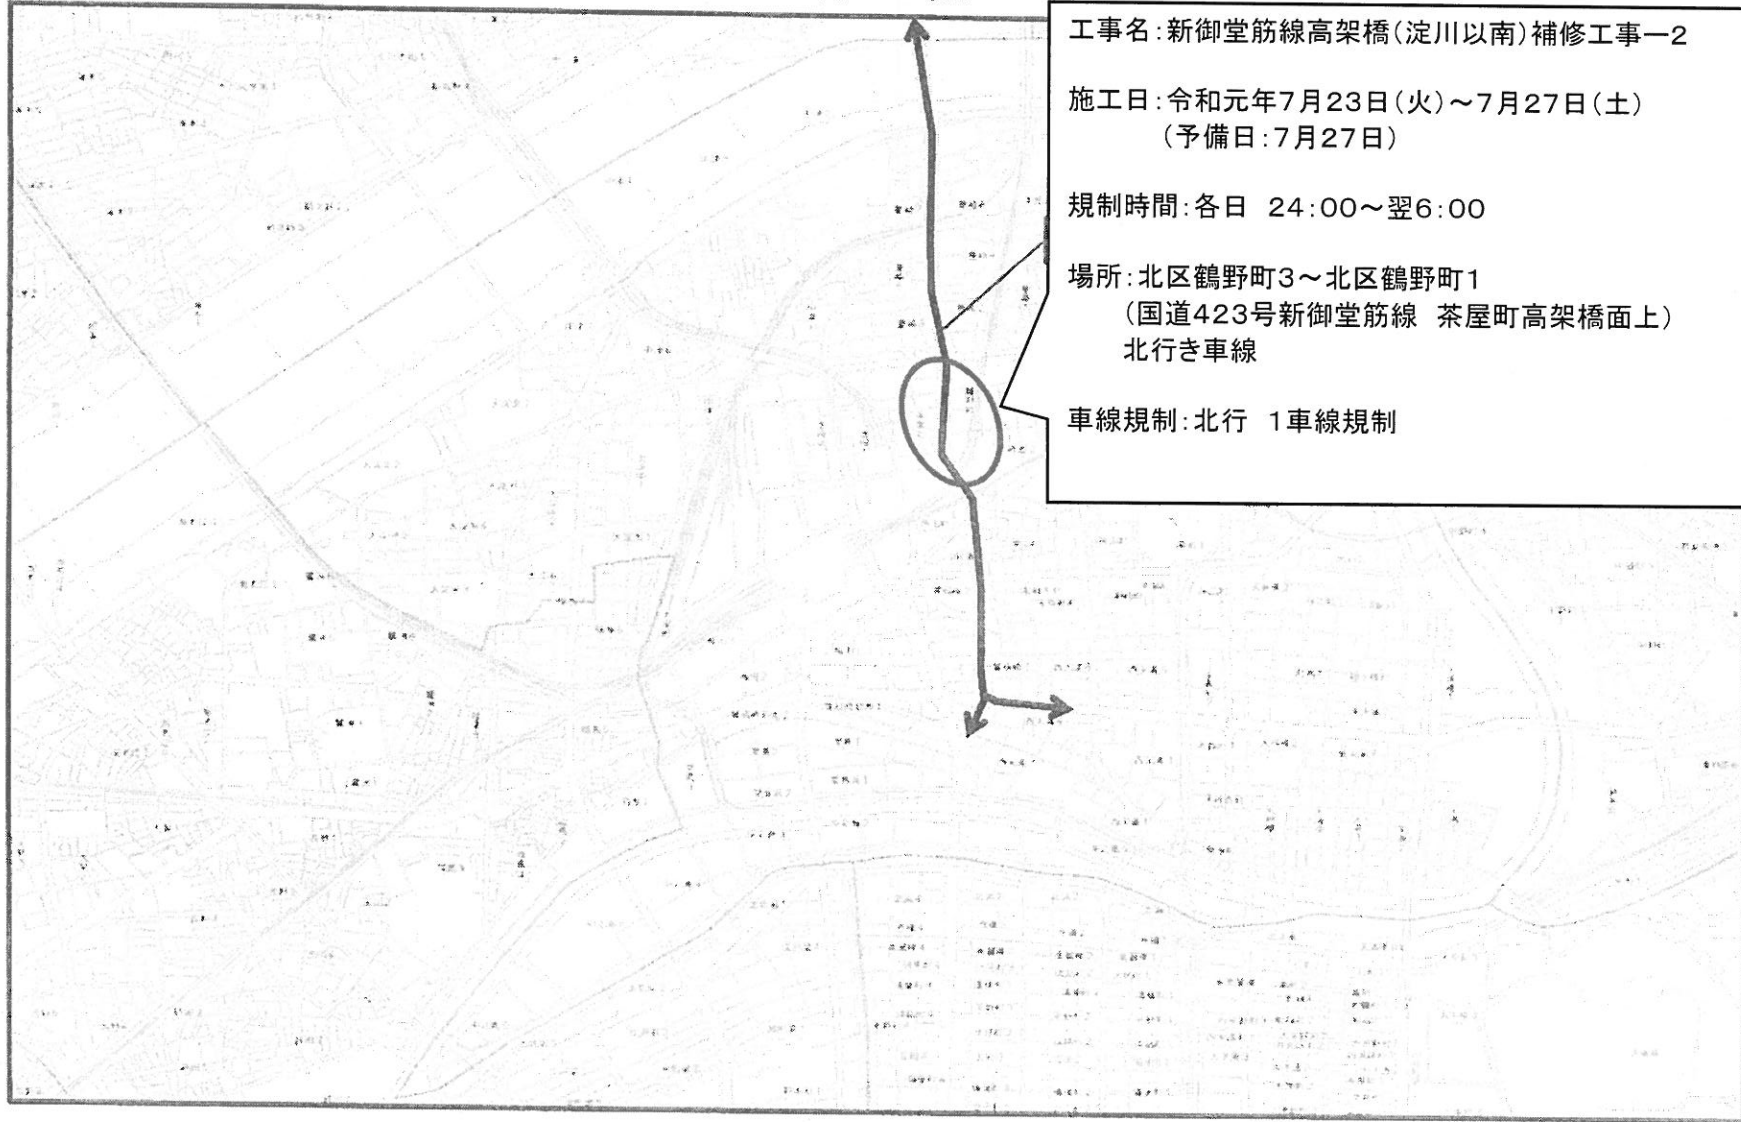

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事-2

施工日:令和元年7月23日(火)~7月27日(土)  
(予備日:7月27日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区鶴野町3~北区鶴野町1  
(国道423号新御堂筋線 茶屋町高架橋面上)  
北行き車線

車線規制:北行 1車線規制

工事名:新御堂筋線高架橋(淀川以南)補修工事一2

施工日:令和元年7月27日(土)、7月28日(日)  
(予備日:7月28日)

規制時間:各日 24:00~翌6:00

場所:北区豊崎4丁目~北区豊崎2丁目  
(国道423号新御堂筋線 豊崎南高架橋面上)  
北行き車線

車線規制:北行 1車線規制

北 区

新御堂筋線高架橋(淀川以南)

